



**Brescia,
La Tua Città
Europea.**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

AVANZAMENTO LAVORI IMPIANTO INDOOR ATLETICA LEGGERA

del **31 GENNAIO 2025**



CITTADELLA DELLO SPORT

› INQUADRAMENTO GENERALE



CLUSTER 1

INDOOR
ATLETICA
LEGGERA

CLUSTER 3

CENTRO DI
PREPARAZIONE
OLIMPICA
GINNASTICA
ARTISTICA

PARCHEGGIO
PUBBLICO A RASO
DA 103 PA

IMPIANTO INDOOR

› INQUADRAMENTO

PISTA DI
ATLETICA
«GABRE GABRIC»
SANPOLINO

AREA DI
INTERVENTO
10.215,79 mq

SUPERFICIE DEL
LOTTO
EDIFICABILE
7.377,60 mq

CAMPO SPORTIVO
COMUNALE
«AZEGLIO VICINI»



IMPIANTO INDOOR

› PLANIMETRIA GENERALE

AREA ESTERNA
DESTINATA AGLI
IMPIANTI

INGRESSO NORD

SUP. COPERTA

6.000 mq

ALTEZZA 16 m

VOLUME 96.000 mc

SPOGLIATOI
ESISTENTI E
TRIBUNA DELLA
PISTA DI ATLETICA
OUTDOOR

INGRESSO SUD

PARCHEGGIO

IMPIANTO INDOOR

PIANTA

PISTA OVALE IN
GOMMA AD ALTE
PRESTAZIONI

DA 200 m - 6
CORSIE

INGRESSO ATLETI

SPOGLIATOI
ESISTENTI E
TRIBUNA DELLA
PISTA DI ATLETICA
OUTDOOR

PARETE DI
ARRAMPICATA

ARTI MARZIALI

PISTA DI VELOCITÀ

60 m
8 corsie

SALTO IN LUNGO

TRIBUNA

1.000 POSTI A SEDERE



Brescia
Infrastrutture



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo Sport

IMPIANTO INDOOR

› VISTA ESTERNO



Brescia,
La Tua Città
Europea.





IMPIANTO INDOOR

› VISTA ARENA DAL FONDO



Brescia,
La Tua Città
Europea.





Brescia
Infrastrutture



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Dipartimento
per lo Sport

IMPIANTO INDOOR

› VISTA ARENA CURVA SX E DX



Brescia,
La Tua Città
Europea.

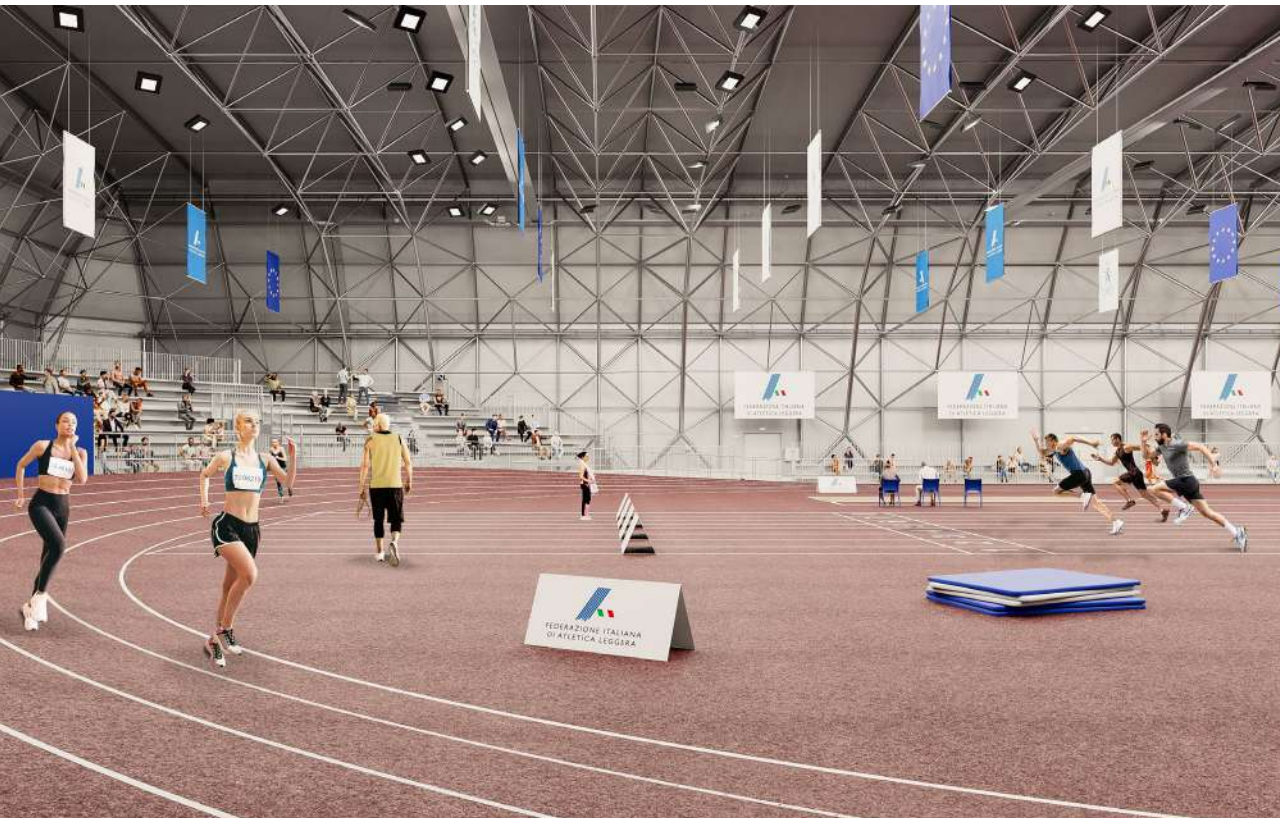



IMPIANTO INDOOR

› VISTA INGRESSO





IMPIANTO INDOOR

› STEP SUCCESSIVI



31/03/2023

Aggiudicazione
definitiva *

13/06/2023

Avvio della
progettazione

Giugno 2024

Avvio dei
lavori

Gennaio 2026

Conclusione dei
lavori

30/05/2023

Sottoscrizione
contratto di
appalto

Maggio 2024

Approvazione del
progetto
esecutivo

OGGI

31 Gennaio 2025

Avanzamento **30%**

31/01/2026

Scadenza fine
lavori PNRR *

* Milestone PNRR



IMPIANTO INDOOR

› QUADRO ECONOMICO



Delibera di Giunta n.210 per approvazione del progetto esecutivo	31/05/2024
Importo del quadro economico	€ 16.251.335,85
Aggiudicazione definitiva	31/03/2023
Ribasso offerto per lavori	6,66 %
Importo lavori di contratto	€ 11.354.964,15
Data di inizio lavori	10/06/2024
Tempo utile per esecuzione lavori	580 giorni naturali consecutivi
Termine fine lavori contrattuale	10/01/2026
Stato avanzamento lavori	30 %



RISORSE FINANZIARIE

Finanziamento PNRR

€ 3.500.000,00

Fondo opere indifferibili

€ 637.188,65

Risorse comunali – Mutuo Credito Sportivo

€ 6.000.000,00

Risorse comunali – Conto Capitale

€ 6.114.147,20

TOTALE

€ 16.251.335,85
